PLAN MAESTRO DE TRABAJO

Cronograma · Dependencias · Riesgos · Hitos

PRODUCTO	DUEÑO DE PRODUCTO (PO)	VERSIÓN / FECHA
Aybar Atiende · Plataforma de Atención al Cliente	Eddie Huamaní	v1.3 · 16-oct-2026
HORIZONTE	**VISIÓN DEL PRODUCTO**	**ESTADO**
Etapa 1 · diseño jue 08-oct → mar 20-oct · desarrollo mié 21-oct → mar 03-nov-2026	Toda solicitud del cliente se registra una sola vez, se atiende con un plazo trazable y se cierra con evidencia, sin exposición ante INDECOPI.	En revisión · comité DoR del mar 20-oct-2026 (cierre de diseño)

Documento centrado en la Etapa 1. Las integraciones con **NEXUS, DAEDALUS y UrbeMind** pasan a la **Etapa 2** (cierre estimado **15-dic-2026**) porque son tecnologías de terceros aún en construcción; la Etapa 1 opera con usuarios, roles y líderes locales (tabla de la sección 0). Orden de prioridad: **1** HU-ATC-043 flujo por tipo, subtipo y área · **2** HU-ATC-050 consulta 360 en el ticket · **3** HU-ATC-067 visor del proceso 3D. La EP-ATC-06 se redefine como **autogestión del cliente en Mi Portal**.

0 HOJA DE RUTA DEL PROYECTO



El 08-oct es feriado (Combate de Angamos): la etapa de diseño trabaja 8 días hábiles. La etapa de desarrollo empieza solo con los requerimientos funcionales y técnicos y las ADR cerrados en el comité DoR del 20-oct. La Etapa 2 se planifica aparte cuando NEXUS, DAEDALUS y UrbeMind publiquen su API.

Orden de prioridad 1-3 (se construyen primero en su desarrollador)

Prioridad	Historia	Funcionalidad / épica	Horas	Dev	Fechas
1	HU-ATC-043 · Configurar el flujo de trabajo de un tipo de ticket por área	FT-ATC-18 · EP-ATC-09	8 h	Dev 3	mié 21-oct → jue 22-oct
2	HU-ATC-050 · Ver la consulta 360 del cliente dentro del ticket	FT-ATC-20 · EP-ATC-10	7 h	Dev 4	mié 21-oct → jue 22-oct
3	HU-ATC-067 · Ver el proceso de atención en un visor 3D (operación en vivo)	FT-ATC-25 · EP-ATC-09	10 h	Dev 3	vie 23-oct → mar 27-oct


Fuera de este plan · Etapa 2 (cierre estimado 15-dic-2026)

Sistema	ID	Requerimiento	Proceso	Cómo opera la Etapa 1 mientras tanto
UrbeMind	RF-SVC-017	Atender incidencias de ciudad como tickets	PROC-SVC-007	Sin incidencias de ciudad en ATC
UrbeMind	RF-SVC-018	Exponer tickets a UrbeMind por API y eventos	PROC-SVC-007	—
UrbeMind	RNF-INT-003	Frontera API/evento con UrbeMind (sin JOIN físico)	PROC-SVC-007	—
NEXUS	RF-SVC-061	Integrar identidad, SSO y roles con NEXUS	PROC-SVC-023	Usuarios y roles locales de ATC (HU-001, ADR-09)
NEXUS	RF-SVC-062	Sincronizar la estructura organizacional desde NEXUS	PROC-SVC-023	Maestro local de gestores y líderes (HU-008, 046, 054, 055)
DAEDALUS	RF-SVC-063	Mostrar la propuesta comercial de DAEDALUS en la consulta 360	PROC-SVC-023	Consulta 360 sin sección DAEDALUS (HU-050)
NEXUS · DAEDALUS	RNF-INT-011	NEXUS y DAEDALUS por API con contrato y simulador	PROC-SVC-023	Adaptadores preparados (ADR-04)

NEXUS, DAEDALUS y UrbeMind los implementan terceros y siguen en construcción. Sus adaptadores quedan preparados en la Etapa 1 (ADR-04 y ADR-09) para conectarlos sin rehacer funcionalidades. Detalle en ATC_requerimientos.xlsx, columnas «etapa» y «etapa_nota» (RN-SVC-043).

1 ETAPA DE DISEÑO · 08 → 20-OCT-2026 (POR DÍA)

FRENTE · ACTIVIDAD · RESPONSABLE	
FUNCIONAL	Alcance del producto y división en Etapa 1 / Etapa 2 PO · patrocinador · entregable: Alcance de la Etapa 1 y RN-SVC-043
FUNCIONAL	Prototipo navegable v2.0 (Consulta 360, Operación en vivo, backoffice) PO · UX · entregable: Prototipo Aybar Atiende v2.0
FUNCIONAL	Refinamiento con áreas usuarias (feedback 1 y 2) PO · áreas usuarias · entregable: RF-SVC-040…060 en el Excel
FUNCIONAL	Cierre funcional: historias, criterios Gherkin y prioridades 1-3 PO · 4 desarrolladores · entregable: PLT-02/03/04 aprobados
TÉCNICO	Arquitectura de desarrollo, modelo de datos y RNF con umbral Líder técnico · 4 desarrolladores · entregable: PLT-05 secc. 3-4
TÉCNICO	Contratos de interfaz (OpenAPI) y simuladores Líder técnico · responsables de API · entregable: Contratos DEP-01, 08, 11-13
TÉCNICO	Base técnica: repositorio, CI/CD, ambientes y guía de IA Líder técnico · entregable: Pipeline en verde · DEV/QA
ADR	ADR: redacción, revisión y aprobación (ADR-01 … 11) Arquitecto · líder técnico · PO · entregable: Registro de ADR aprobado

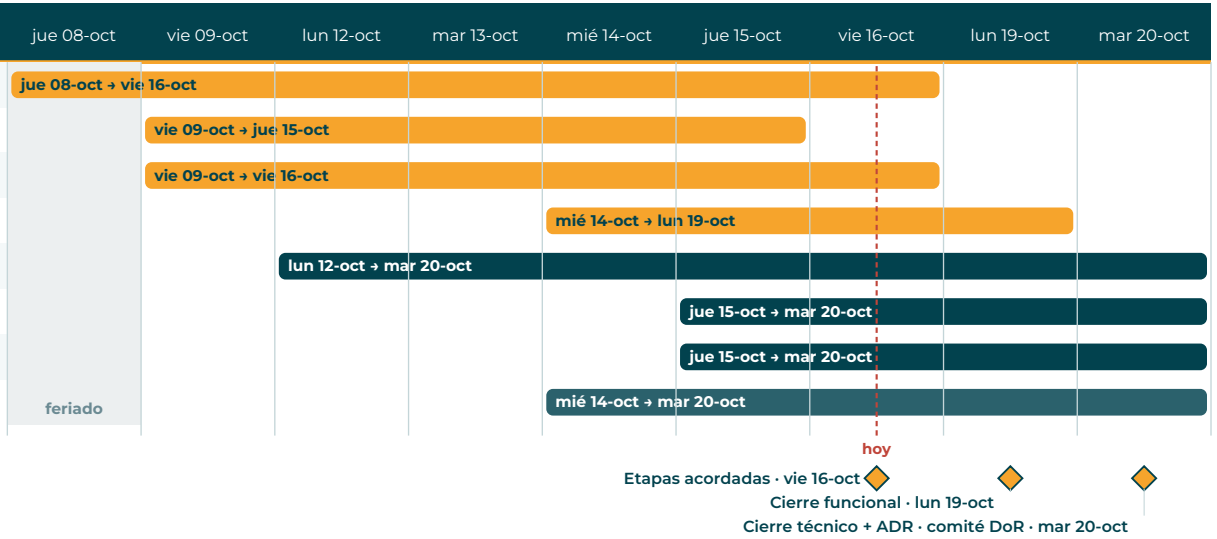

Frente funcional Frente técnico Decisiones de arquitectura (ADR)


Criterios de salida de la etapa de diseño (entrada al desarrollo)

Cierre	Qué queda cerrado	Evidencia	Responsable	Fecha
Funcional	62 historias con criterios Gherkin, orden de prioridad 1-3, alcance de la Etapa 1 y preguntas abiertas resueltas o parametrizadas	PLT-02, PLT-03 y PLT-04 v1.3 aprobados · prototipo v2.0	PO	lun 19-oct
Técnico	Arquitectura de desarrollo, modelo de datos (entidades «por modelar» cerradas), RNF con umbral, contratos de interfaz con simulador, CI/CD y ambientes DEV/QA	PLT-05 secc. 3-4 · OpenAPI · pipeline en verde	Líder técnico	mar 20-oct
ADR	11 decisiones de arquitectura registradas con contexto, decisión y consecuencias	Registro de ADR (tabla siguiente y PLT-05)	Arquitecto · líder técnico	mar 20-oct
DoR	Comité DoR: cada funcionalidad «Lista» o «Lista con condiciones» con fecha	PLT-05 · acta del comité	PO · equipo	mar 20-oct

Registro de ADR de la Etapa 1 (a aprobar el 20-oct)

ID	Decisión	Motivo / historias	Alcance
ADR-01	Monolito modular por capacidad (NestJS) sobre la infraestructura vigente	Equipo pequeño y plazo corto: un despliegue, módulos separables a futuro	Técnico
ADR-02	Bitácoras append-only con IntegrityHash HMAC-SHA256	Evidencia ante INDECOPI y auditoría (RNF-AUD-004)	Técnico
ADR-03	El dato del cliente no se copia: consulta 360 federada en línea, con caché corta y degradación por fuente	RN-SVC-026 · HU-050 (prioridad 2)	Funcional y técnico
ADR-04	Integraciones contract-first: adaptador + simulador; la API real se activa cuando existe	APIs externas sin fecha (R-02); prepara la Etapa 2	Técnico
ADR-05	Jobs batch idempotentes para SLA y plazo legal con calendario MAE_TIME/MAE_HOLIDAY	Plazos en días hábiles y feriados	Técnico
ADR-06	Evidencia probatoria en S3 con Object Lock y checksum	Libro de Reclamaciones y casos sensibles	Técnico
ADR-07	IA solo vía servicio de asistencia, con anonimización y registro; la IA sugiere, el gestor decide	RN-SVC-032 · RNF-SEC-009	Funcional y técnico
ADR-08	Motor de flujos configurable por tipo + subtipo + área, versionado; el ticket congela su versión	HU-043 (prioridad 1) · RN-SVC-045	Funcional y técnico
ADR-09	Usuarios, roles y líderes locales en Etapa 1 detrás de una interfaz de identidad; NEXUS la reemplaza en Etapa 2	NEXUS en construcción (cierre estimado 15-dic)	Técnico
ADR-10	Visor 3D en el navegador (canvas isométrico) alimentado por eventos en tiempo real (WebSocket), con vista 2D alternativa	HU-067 (prioridad 3) · sin plugins ni GPU dedicada	Técnico
ADR-11	Mi Portal: acceso del cliente con DNI + código de un solo uso al contacto registrado en SIGDA/TAXON	HU-064 a 066 · Ley 29733	Funcional y técnico

2 ETAPA DE DESARROLLO · 21-OCT → 03-NOV-2026 (POR DÍA)

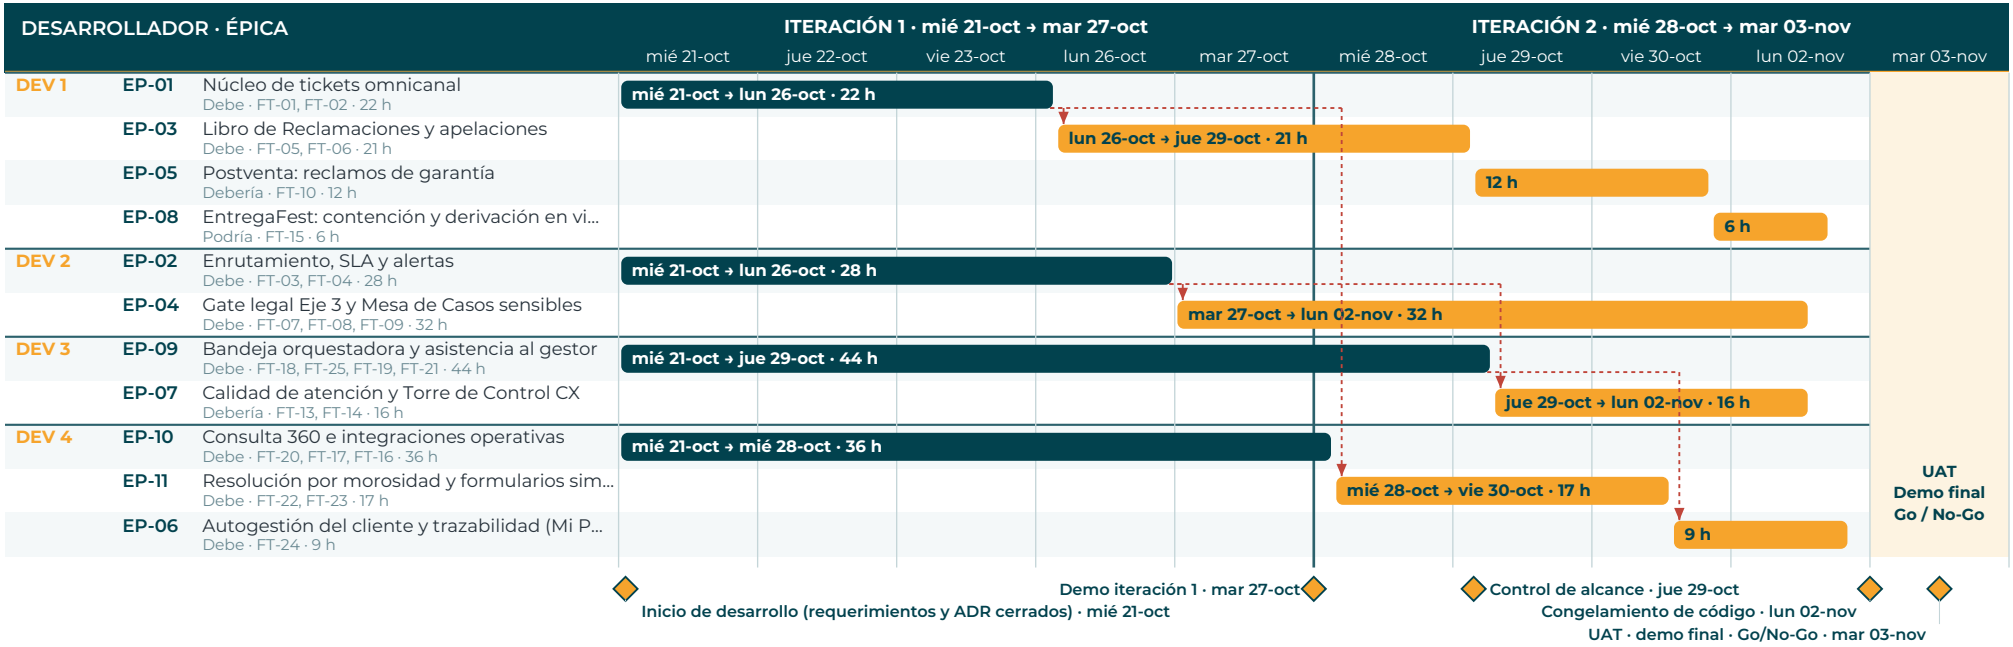

Épica habilitadora · Épica de valor de negocio · Dependencia lógica (A → B) · Hito · Día de UAT y pase (sin desarrollo nuevo)

Fuente: **ATC_requerimientos.xlsx (Google Drive) · versión con división por etapas, 16-oct-2026**. Etapa 1: 23 funcionalidades, 62 historias (58 RF del Excel + 4 propuestas del PO v1.3: RF-SVC-064…067). Equipo: **4 desarrolladores asistidos por IA**; capacidad de historias 252 h (días 1-9 = 7 h, día 10 = UAT y pase; la base técnica se cierra en la etapa de diseño); comprometido **243 h (96%)**. Cada épica la construye un solo desarrollador; las fechas se calculan hora a hora. **Ahora** = las 62 historias, todas con fecha · **Flexible** = lo primero que sale si el control de alcance del jue 29-oct muestra atraso (sin afectar la v1.0) · **Después** = Etapa 2 (sección 0) y pendientes de producto (conectores automáticos de WhatsApp y correo). Las integraciones externas se entregan contra simuladores; las fechas por historia están en PLT-04.

2b RESUMEN DE ÉPICAS, RESPONSABLE Y FECHAS

ID	Épica	Tipo	MoSCoW	Funcionalidades	Dev	Inicio	Fin	Horas	Iter.	Patrocinador (por confirmar)
EP-ATC-01	Núcleo de tickets omnicanal	Habilitadora	Debe	FT-01, FT-02	Dev 1	21-oct-2026	26-oct-2026	22	1	Gerencia de Experiencia del Cliente
EP-ATC-03	Libro de Reclamaciones y apelaciones	Valor de negocio	Debe	FT-05, FT-06	Dev 1	26-oct-2026	29-oct-2026	21	1 y 2	Gerencia Legal

ID	Épica	Tipo	MoSCoW	Funcionalidades	Dev	Inicio	Fin	Horas	Iter.	Patrocinador (por confirmar)
EP-ATC-05	Postventa: reclamos de garantía	Valor de negocio	Debería	FT-10	Dev 1	29-oct-2026	30-oct-2026	12	2	Gerencia de Postventa
EP-ATC-08	EntregaFest: contención y derivación en vivo	Valor de negocio	Podría	FT-15	Dev 1	30-oct-2026	02-nov-2026	6	2	Dirección UX
EP-ATC-02	Enrutamiento, SLA y alertas	Habilitadora	Debe	FT-03, FT-04	Dev 2	21-oct-2026	26-oct-2026	28	1	Gerencia de Experiencia del Cliente
EP-ATC-04	Gate legal Eje 3 y Mesa de Casos sensibles	Valor de negocio	Debe	FT-07, FT-08, FT-09	Dev 2	27-oct-2026	02-nov-2026	32	1 y 2	Gerencia Legal / Dirección UX
EP-ATC-09	Bandeja orquestadora y asistencia al gestor	Habilitadora	Debe	FT-18, FT-25, FT-19, FT-21	Dev 3	21-oct-2026	29-oct-2026	44	1 y 2	Gerencia de Experiencia del Cliente
EP-ATC-07	Calidad de atención y Torre de Control CX	Valor de negocio	Debería	FT-13, FT-14	Dev 3	29-oct-2026	02-nov-2026	16	2	Dirección UX
EP-ATC-10	Consulta 360 e integraciones operativas	Habilitadora	Debe	FT-20, FT-17, FT-16	Dev 4	21-oct-2026	28-oct-2026	36	1 y 2	Gerencia de TI · Gerencia Legal
EP-ATC-11	Resolución por morosidad y formularios simples	Valor de negocio	Debe	FT-22, FT-23	Dev 4	28-oct-2026	30-oct-2026	17	2	Gerencia de Cobranza · Gerencia Comercial
EP-ATC-06	Autogestión del cliente y trazabilidad (Mi Portal)	Valor de negocio	Debe	FT-24	Dev 4	30-oct-2026	02-nov-2026	9	2	Gerencia de Experiencia del Cliente

2c CAPACIDAD, CARGA Y CADENCIA DEL EQUIPO

Recurso	Foco	Épicas (en orden)	Comprom.	Capacidad	Carga	Holgura
Dev 1	Núcleo de tickets · Libro de Reclamaciones · Garantías · EntregaFest	EP-01 → EP-03 → EP-05 → EP-08	61 h	63 h	97%	2 h
Dev 2	Enrutamiento · SLA · Gate legal y Mesa SGD	EP-02 → EP-04	60 h	63 h	95%	3 h
Dev 3	Flujos por área (P1) · Visor 3D (P3) · Bandeja orquestadora · Asistencia IA · Calidad CX	EP-09 → EP-07	60 h	63 h	95%	3 h
Dev 4	Consulta 360 (P2) · Integraciones · Morosidad · Autogestión del cliente	EP-10 → EP-11 → EP-06	62 h	63 h	98%	1 h
Equipo	4 desarrolladores asistidos por IA	11 épicas · 23 funcionalidades · 62 HU	243 h	252 h	96%	9 h

Cadencia	Daily 9:00 (15 min) · aceptación del PO cada día a las 17:00 sobre lo terminado · demostración de la iteración 1 el mar 27-oct · control de alcance el jue 29-oct · congelamiento de código el lun 02-nov 18:00 · UAT, demostración final y Go/No-Go el mar 03-nov.

Trabajo con IA	Cada historia se construye con un asistente de IA a partir de su ficha PLT-04 (historia, criterios Gherkin y diagramas): el desarrollador genera código y pruebas, revisa todo lo generado, y otro desarrollador hace la revisión de pares antes de integrar. Las estimaciones en horas ya consideran esta forma de trabajo.
Holgura	9 h del equipo se reservan para pruebas E2E y para apoyar al desarrollador más cargado; la EP-ATC-08 (EntregaFest) pasa a Dev 1 para liberar a Dev 3, que construye las prioridades 1 y 3. El día 10 completo es para UAT, correcciones y pase.

3 DEPENDENCIAS


ID	Dependencia	Tipo	Bloquea a	Responsable	Fecha requerida	Estado
DEP-01	API de SIGDA/TAXON: consulta de cliente y KYC (única fuente del dato)	Interna	EP-01, EP-04, EP-06, EP-10	CDO / Equipo Datos	21-oct-2026	Pendiente
DEP-02	Maestro local de usuarios, roles, áreas y líderes de ATC (carga inicial de RR. HH.); NEXUS lo reemplaza en Etapa 2	Interna	EP-01, EP-02, EP-09	Gerencia ATC · RR. HH.	21-oct-2026	Pendiente
DEP-03	Decisión de negocio: matriz SLA por tipo y prioridad y plazos de línea de la Mesa SGD (RNF-REN-003)	Interna	EP-02, EP-04	Gerencia ATC · Mesa SGD	22-oct-2026	Pendiente
DEP-04	Calendario MAE_TIME + MAE_HOLIDAY por geografía	Técnica	EP-02, EP-03	Equipo Datos	22-oct-2026	En curso
DEP-05	Validación legal: formato del asiento, textos y plazos del Libro	Legal	EP-03, EP-11	Gerencia Legal	26-oct-2026	Pendiente
DEP-06	Repositorio documental S3 + GOV_DOCUMENT_REPOSITORY y GLI	Técnica	EP-01, EP-03, EP-04, EP-10	Arquitectura / Legal	23-oct-2026	En curso
DEP-07	Contratos y Activos: API de contrato, unidad, Acta de Entrega y cobertura	Interna	EP-05	Equipo Contratos	29-oct-2026	Pendiente
DEP-08	Cobranza: estado de cuenta, historial de pagos y cuotas vencidas por contrato (desfase ≤ 24 h)	Interna	EP-04, EP-10, EP-11	Cobranza	21-oct-2026	Pendiente
DEP-10	KPI Engine + SVY_SURVEY_RESPONSE (encuestas)	Interna	EP-07	Equipo Datos / BI	29-oct-2026	Pendiente
DEP-11	Plataforma del call center: API/CTI para screen pop, registro de llamadas, grabación y click-to-call	Externa	EP-10	TI / proveedor de call center	21-oct-2026	Por evaluar
DEP-12	Herramienta de Legal (responsable: Rosario): API o intercambio para sincronizar casos de Eje 3	Interna	EP-10	Gerencia Legal · TI	26-oct-2026	Por evaluar
DEP-13	Motor de consultas de José: contrato de API y responsable de mantenimiento	Interna	EP-10	José · TI	23-oct-2026	Por evaluar
DEP-14	Proveedor de IA aprobado por TI y Seguridad, con política de datos personales	Técnica	EP-09, EP-10	TI · Seguridad	23-oct-2026	Por evaluar
DEP-15	Maestro de responsables de proyecto y supervisores (fuente única)	Interna	EP-11	Gerencia Comercial · Datos	29-oct-2026	Pendiente

Tipos: **Interna** (otro equipo AYBAR) · **Externa** (proveedor / regulador) · **Técnica** (infraestructura, datos) · **Legal**. **Fecha requerida** = inicio de la primera historia que bloquea; el contrato de interfaz (o la decisión) se cierra antes, en la etapa de diseño (20-oct), y con él se construye contra un simulador. La API real se necesita antes del pase a producción de esa integración. DEP-09 (UrbeMind) pasa a la Etapa 2.

4 RIESGOS (MÁXIMO 10)

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel	Mitigación / plan de contingencia	Dueño
R-01	Plan con poca holgura: 243 h comprometidas de 252 h de capacidad (96%); Dev 4 al 98%	Alta	Alto	ALTO	Alcance «flexible» (RF-048, 053, 037-039) definido de antemano; control de alcance el jue 29-oct; las prioridades 1-3 (HU-043, 050, 067) se construyen primero	PO
R-02	APIs externas no disponibles en el plazo (SIGDA/TAXON, call center, Legal, Cobranza, motor de José); NEXUS, DAEDALUS y UrbeMind pasan a la Etapa 2	Alta	Alto	ALTO	Contratos de interfaz y simuladores cerrados en la etapa de diseño (20-oct); pase a producción de cada integración condicionado a su API real	Líder técnico
R-03	Matriz SLA y plazos de línea de la Mesa SGD sin definir al iniciar el motor SLA (jue 22-oct)	Alta	Alto	ALTO	Matriz provisional parametrizable firmada por Gerencia ATC al cierre de diseño (20-oct)	Gerencia ATC
R-04	Calidad del código generado con IA (errores sutiles, seguridad, deuda técnica)	Media	Alto	ALTO	Revisión de pares obligatoria, pruebas automatizadas generadas y revisadas por el desarrollador, análisis SAST y guía de prompts del equipo	Líder técnico
R-05	Sin QA dedicado y UAT concentrada en un día (mar 03-nov)	Media	Alto	ALTO	Aceptación diaria del PO a las 17:00, pruebas E2E automatizadas desde el día 3 y usuarios clave citados para la UAT	PO · Jefe Operaciones UX
R-06	Ítems con alcance ambiguo (8 % de interés, rayo, «llamar la cuenta», cancelación del servicio, buses, acceso del cliente a Mi Portal)	Alta	Medio	ALTO	Cerrarlos en el cierre funcional del 19-oct; lo no resuelto se construye parametrizable	PO
R-07	Datos personales expuestos en bitácoras, búsqueda, Mi Portal o prompts de IA (Ley 29733)	Media	Alto	ALTO	DLP (RNF-SEC-008), anonimización antes de la IA (RNF-SEC-009), permisos del origen (RNF-SEC-010) y visibilidad del cliente (RN-SVC-044)	Seguridad TI
R-08	Textos legales (Libro, alerta de cancelación, carta al proyecto) sin validar al pase	Media	Alto	ALTO	Plantillas configurables; validación de Legal antes del lun 26-oct (Libro) y del mié 28-oct (morosidad)	Gerencia Legal
R-09	Ausencia de un desarrollador (bus factor de 1 por épica)	Baja	Alto	MEDIO	Documentación viva generada con IA, revisión cruzada diaria y repositorio común; replanificar con el alcance flexible	Líder técnico
R-10	Adopción: el equipo sigue en Excel/WhatsApp y el cliente no usa Mi Portal	Media	Medio	MEDIO	Capacitación el mar 03-nov, término «Gestor de tickets» en toda la interfaz (RNF-USA-003), aviso con enlace a Mi Portal en cada ticket y retiro de herramientas paralelas	Jefe Operaciones UX

Se registran los 10 riesgos más relevantes de la Etapa 1, priorizados por nivel. Los demás se gestionan en el registro de riesgos del proyecto.

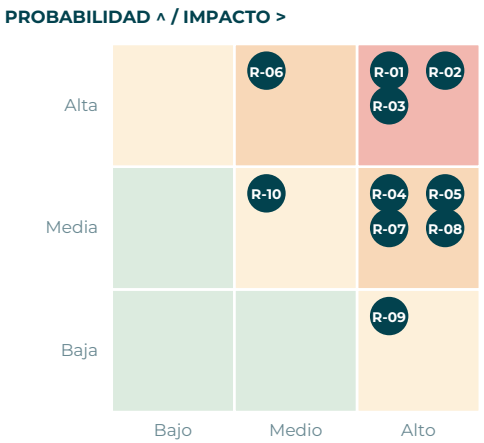

Cómo usar la matriz

Ubicar cada riesgo por probabilidad e impacto. Los de nivel **Alto** (8 de 10) tienen dueño, mitigación y se revisan en la daily. Los más urgentes son **R-01** (plan con poca holgura), **R-02** (APIs externas) y **R-03** (matriz SLA, necesaria al cierre de diseño, 20-oct).

Supuestos: Etapa de diseño del 08 al 20-oct (cierra requerimientos funcionales, técnicos y ADR); 4 desarrolladores dedicados al 100 % del 21-oct al 03-nov, con asistentes de IA; el PO acepta historias a diario; las integraciones externas se construyen contra simuladores; PostgreSQL Multi-AZ y S3 existen en la arquitectura vigente.

Restricciones: Etapa 1 con plazo fijo de 10 días hábiles de desarrollo (21-oct → 03-nov-2026); integraciones con NEXUS, DAEDALUS y UrbeMind en Etapa 2 (cierre estimado 15-dic-2026); sin QA dedicado; Ley 29571 art. 24 y Ley 29733; la IA solo sugiere (RN-SVC-032).

5 CONTROL DE VERSIONES Y APROBACIÓN

Versión	Fecha	Autor	Cambio	Aprobado por
v1.0	29-sep-2026	Eddie Huamaní (PO)	Versión inicial: 8 épicas, 15 funcionalidades, 11 dependencias, 8 riesgos (horizonte de 12 meses)	—
v1.1	02-oct-2026	Eddie Huamaní (PO)	Plantillas v1.1: fechas en días hábiles, ruta crítica, estimación en horas, riesgos R-09 y R-10	—
v1.2	14-oct-2026	Eddie Huamaní (PO)	Alcance con los 2 feedbacks (21 RF nuevos, 3 épicas, 8 funcionalidades) y replanificación a 2 semanas con 4 desarrolladores asistidos por IA; término «Gestor de tickets»; conectores RF-P al pendientes de producto; 15 dependencias con fecha y 10 riesgos nuevos	—
v1.3	16-oct-2026	Eddie Huamaní (PO)	Documentación centrada en la Etapa 1: etapa de diseño 08 → 20-oct (cierre funcional, técnico y 11 ADR) y desarrollo 21-oct → 03-nov; UrbeMind, NEXUS y DAEDALUS a la Etapa 2; EP-ATC-06 = autogestión del cliente en Mi Portal (HU-064…066); prioridades 1-3: HU-043, HU-050 y HU-067 visor 3D	Pendiente · Patrocinador
